

Flur H15 Kellergeschoss – Zu Beginn der Sanierungsarbeiten



Nach Ausbau der Unterdecken und Teilrückbau haustechnischer Leitungen. Die Schilfrohrdecken unterhalb der Stb-Rippendecken sind noch eingebaut.

Flur H15 Kellergeschoss – In der Sanierungsphase



Die Deckenertüchtigungen sind fertiggestellt. Die Elt-Trassen sind eingebaut und belegt. Nur noch Einzelkabel sind provisorisch verlegt.

Raum H24 Kellergeschoss – In der Sanierungsphase




Deckenertüchtigung unter freigelegten Stb-Rippendecken ist erfolgt. HLS-Trasse neu unterhalb der Deckenertüchtigung.

Raum H24 Kellergeschoss – In der Sanierungsphase



Deckenertüchtigungen und HLS-Installationen sind fertiggestellt. Deckenraster der Sichtdecken sind eingebaut. Wände sind durch Maler, Böden durch Bodenverleger vorbereitet.

Flur H84 Kellergeschoss (Nebenflur Lager) – In der Sanierungsphase

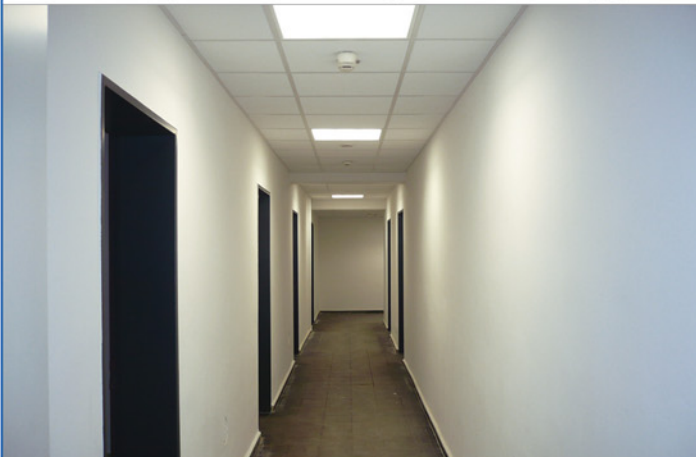

Untergehängte Sichtdecke ohne Brandschutz ist unterhalb der Deckenertüchtigung und Leitungen eingebaut.

Bettzentrale B05 – Kellergeschoss



Nach Sanierung, vor Nutzung / Inbetriebnahme
